

Jose L. Nunes G.

Ruc: 0152015491001

Dirección: Coop. Urbanor Mz 149 Sl 12a Guayaquil

Telefonos: 096 265 0742 / 099 270 2688

E-mail: [sopORTE.tecnotelca@gmail.com](mailto:sopORTE.tecnotelca@gmail.com)

#### CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificado N°: 019

CCT-ECU210524019F

#### DATOS DEL CLIENTE

Cliente: FIBERDINPRO S.A

Ruc: 0992890355001

Dirección: Calicuchima y Villavicencio 1005 SN

#### DATOS DEL EQUIPO A CALIBRAR

Descripción: Fusionadora

Marca: Signalfire

Modelo: AI-9


Serial: A12S22101574

#### EQUIPOS A UTILIZAR

<u>MODELO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>N° SERIE</u>	<u>FECHA DE CALIBRACION</u>
K720	OTDR	21010065S	15/08/2023
FHP2A04	POWER METER SM UPC	E203P13754	25/03/2023
FHS2D02F	FUENTE DE LUZ SC UPC -05.00 dBm	E204S04224	20/03/2023
CONNECTION COT-5021	BOBINA DE LANZAMIENTO 1KM SC APC	N/A	N/A

#### DETALLE TECNICO

El equipo requiere; cambio de electrodos, calibración de sensores, calibración de motores y ajuste de parámetros.

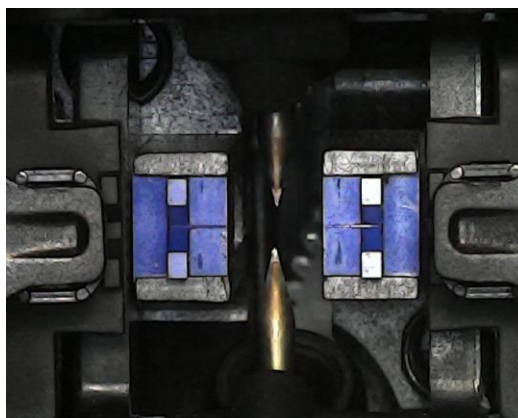

Img 1 Requiere cambio de electrodos.

**Jose L. Nunes G.**

**Ruc:** 0152015491001

**Dirección:** Coop. Urbanor Mz 149 Sl 12a Guayaquil

**Telefonos:** 096 265 0742 / 099 270 2688

**E-mail:** [sopORTE.tecnotelca@gmail.com](mailto:sopORTE.tecnotelca@gmail.com)


Certificado N°: 019

CCT-ECU210524019F


## RESULTADOS DE LA CALIBRACION

El uso de diversos instrumentos de medición, métodos, fibra óptica o pruebas en diferentes entornos puede provocar resultados de pruebas diferentes. Las pruebas realizadas certifican que los elementos anteriores se han probado bajo los requerimientos y estándares establecidos por el fabricante SIGNALFIRE, LTD

Los procedimientos realizados en las pruebas de desempeño nos permitieron obtener resultados positivos en el diagnóstico, ajuste y calibración del equipo. Todo enmarcado en las especificaciones exigidas por cada fabricante.



Img 2 Activacion de electrodos correcta

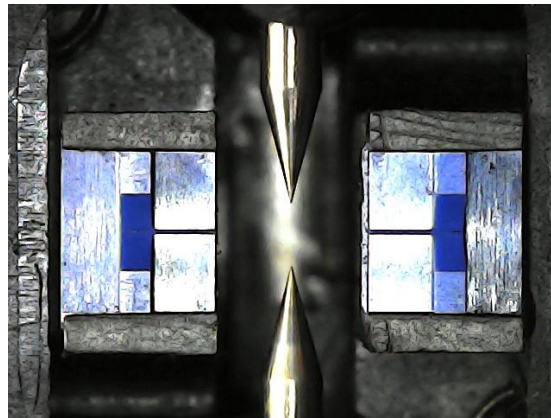

Img 3 Reemplazo de electrodos

**Jose L. Nunes G.**

**Ruc:** 0152015491001

**Direccion:** Coop. Urbanor Mz 149 Sl 12a Guayaquil

**Telefonos:** 096 265 0742 / 099 270 2688

**E-mail:** [sopORTE.tecnotelca@gmail.com](mailto:sopORTE.tecnotelca@gmail.com)

Certificado N°: 019

CCT-ECU210524019F

PROGRAMA	SM	SM	SM	SM	SM	MM	MM	MM	MM	MM
PERDIDA	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
TIPO DE FIBRA	G.652D	G.652D	G.652D	G.652D	G.652D	OM3	OM3	OM3	OM3	OM3
AJUSTE	ELECTRODOS	✓	CAMARAS	✓	HOLDERS	✓	MOTORES	✓	LEDS	✓

Tabla 1 Validacion de fusiones y perifericos.

< Registro de empalmes Más

Tiempos de fusión acumulados: 6188 veces

Número de  ▼

Especificar  ▼

Ver por 165 veces

100.0%

2022-05-21 - 2024-05-21

número de serie	Pérdida de empalme	Tiempo	Imagen d
1	0.00	2024-05-21 20:20:29	
2	0.01	2024-05-21 20:18:45	
3	0.01	2024-05-21 20:14:55	
4	0.02	2024-05-18 18:41:30	
5	0.01	2024-05-18 17:33:23	
6	0.01	2024-05-18 17:32:26	

BORRAR REGISTROS REGISTRO VACÍO DEL SO...

Img 7 Resultados de las fusiones

Jose L. Nunes G.

Ruc: 0152015491001

Dirección: Coop. Urbanor Mz 149 Sl 12a Guayaquil

Telefonos: 096 265 0742 / 099 270 2688

E-mail: [soporte.tecnotelca@gmail.com](mailto:soporte.tecnotelca@gmail.com)

Certificado N°: 019

CCT-ECU210524019F

#### PRUEBAS DE LA CALIBRACION

PERDIDA ESTIMADA DE LA FUSIONADORA	PERDIDA MEDIDA OTDR	POTENCIA DE FUENTE DE LUZ	MEDICION DE POWERMETER	PERDIDA RELATIVA
0.00 dBm	0.17 dBm	-05.00 dBm	-05.21 dBm	0.11 dBm
0.01 dBm	0.11 dBm	-05.00 dBm	-05.19 dBm	0.09 dBm
0.01 dBm	0.13 dBm	-05.00 dBm	-05.18 dBm	0.08 dBm
0.02 dBm	0.18 dBm	-05.00 dBm	-05.25 dBm	0.15 dBm
0.01 dBm	0.19 dBm	-05.00 dBm	-05.17 dBm	0.07 dBm

#### CONDICIONES DE LA CALIBRACION

Temperatura ambiente:  $28 \pm 2$  °C

Presión Atmosférica: 1011 hPa

Humedad Relativa:  $80 \pm 5$  %

#### RECOMENDACIÓN Y CONCLUSION TECNICA

- Se recomienda mantener el equipo y sus elementos limpios y/o hacerle limpieza después de cada jornada laboral, ya que esto impedirá que se acumule polvo y se vea afectado el desempeño del equipo.
- Se recomienda no exponer la maquina en ambientes húmedos o aquellos ambientes donde haya condensación.
- Se recomienda realizar ajuste de arco cada vez que haya un cambio climático, así se prolonga la vida de los electrodos.
- La FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA SIGNALFIRE AI-9 quedo funcionando y calibrada para a la emisión de este certificado.
- El equipo se encuentra actualizado.
- El horno funciona correctamente.
- La batería funciona correctamente.

Fecha de Calibración: 21/05/2024

VERIFICADO POR:

Validez de la Calibración: 21/05/2025
